



Hej Alle


Hermed SK Forsynings nyhedsmail nr. 10 vedr. kloakeringsprojektet for Frølunde Fed. Vi har siden sidste nyhedsmail fået de længe ventede første leverancer af pumpebrønde, hvilket betyder at vi nu er kommet ind i en fase hvor der generelt fortrinsvist vil foregå gravearbejder.

Vi er ligeledes i gang med at forberede til Tour d. France, forstået på den måde at vi er ved at etablere byggeplads længere nede af Broholmvej hvor vi skal bo i resten projektet. Den midlertidige byggeplads vi har pt. skal nemlig bruges til parkering af autocampere i forbindelse med Tour D. France.

Sommerferieperioden nærmer sig ligeledes med hastige skridt. Anlægsarbejdet vil som udgangspunkt, som tidligere meldt ud ligge stille i det meste af juli måned. Mere info om dette i næste nyhedsmail som udsendes i uge 26.

Vi havde i sidste nyhedsbrev lovet at vedhæfte materialet fra infomødet, således at dem af jer der var forhindret, har mulighed for at se præsentationerne. Præsentationerne er vedhæftet denne mail. Vi har ligeledes forsøgt at notere alle de spørgsmål/svar der var på mødet, men den må i lige have til gode til en af de efterfølgende nyhedsmails.

## Status for projekt

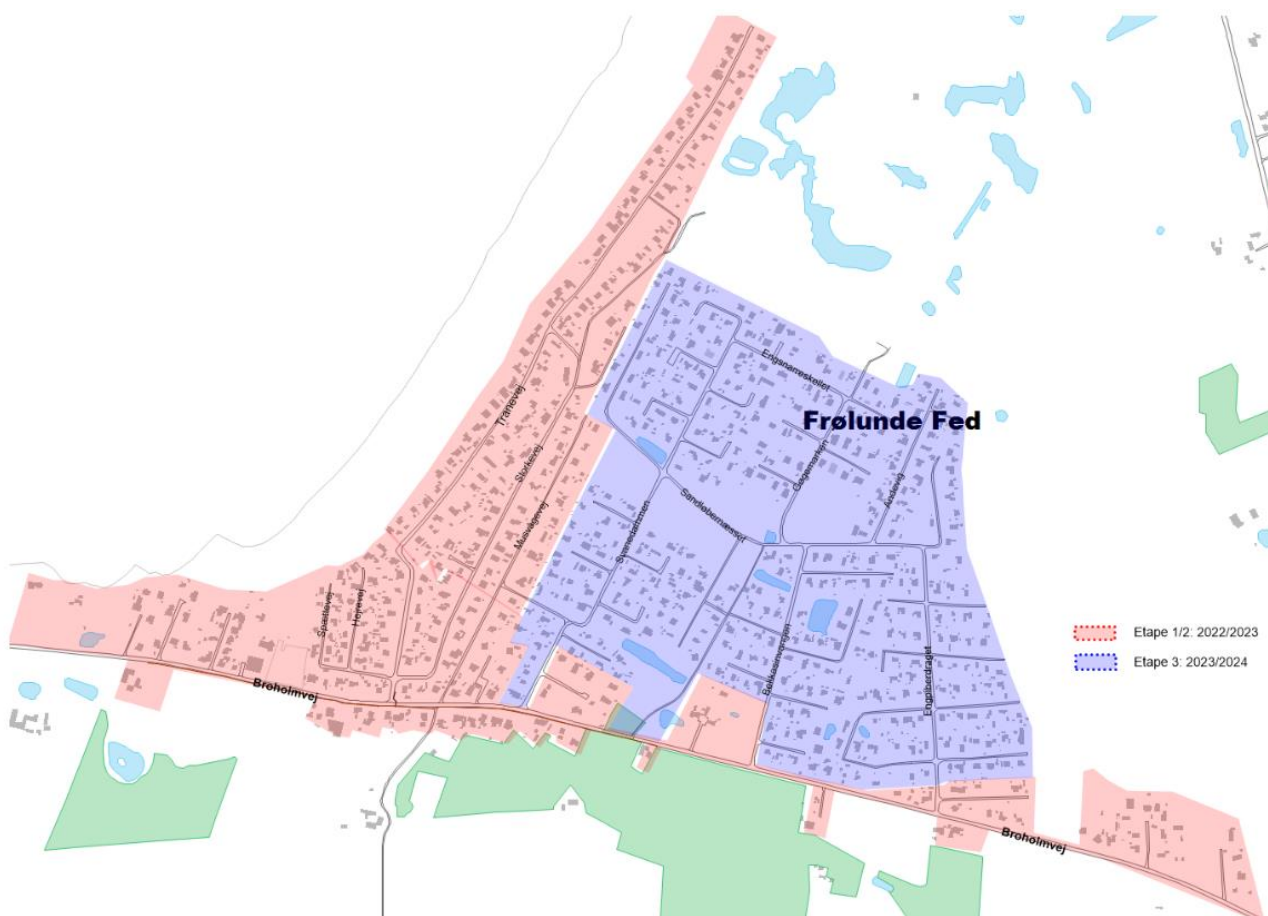

## Status - Etape 1/2 ( de private matrikler)

Som tidligere beskrevet bliver arbejdet generelt fortsat udført i følgende rækkefølge som nedenfor.

1. Udførsel af styret underboring, inkl. forudgående prøvegravninger for lokalisering af ledninger/kabler
2. Nedboring af hustandspumper og minipumper – inden nedboring etableres lille sugespidsanlæg i området hvor pumpestationen skal nedbores. Sugespidsanlægget fjernes/flyttes igen når pumpebrønd er nedboret.
3. Gravning af hoved og stikledninger – inden opgravning etableres sugespidsanlæg langs udgravningen
4. Gravning for strømforsyning og sætning af styreskabe og kabelskabe (denne aktivitet rykkes muligvis op i rækkefølgen, alt efter hvornår vi kan få leveret styreskabe, og hvornår vi kan få etableret strømforsyning)

Vi er nu helt færdige med at lave styret underboring i denne ombæring.

Vi har nu også fået sat de første pumpestationer (Broholmvej 55,67,69D). Vi har nu fået de første erfaringer og kan konstatere at det er absolut nødvendigt at have sugespidsanlæg kørende før vi graver. Det vi også kan se, er at sugespidserne skal gerne køre 1 til 2 uger før vandet er sænket så meget at vi kan grave. Vi skal derfor gerne være nogle uger foran med sugespidsanlæggene i forhold til gravearbejdet. Den næste uge vil vi fortsætte med at grave på stikvejene langs Broholmvej, samt etablere sugespidsanlæg til kommende områder hvor vi skal grave.

Vi er nu også i gang med at etablere vores egentlige byggeplads på marken ved siden af Broholmvej 170 hvor vi skal være resten af projektet.

Tranevej, Spættevej, Hejrevej Storkevej: Der vil ikke blive arbejdet på jeres veje før efter sommerferien. I uge 31 vil der blive foretaget afsætning/opmåling, og fra uge 32 vil der blive foretaget prøvegravninger og styret underboring. Inden disse arbejder igangsættes afholdes vejsyn med deltagelse af jeres grundejerforening, og kommunen.

## Status - Etape 3 (Omegnens Fritidshaveforening)

Møde afholdt d. 31. maj mellem OF og SK i OF's foreningshus. Udførsel af kloakering i jeres område bliver højst sandsynlig i 2024/2025 hvilket er lidt senere end tidligere udmeldt. Herudover drøftede vi ligeledes jeres interne vandledningsnet, og målere i relation til den kommende kloakering.

### Vedr. d. aktuelle kloakering af etape 1/2

I forbindelse med vores sugespidsanlæg, har vi behov for et sted at lede vandet fra anlæggene til. Da der ikke er noget vejafvanding el lign. i området har vi efter aftale med jeres bestyrelse fundet et par steder v. OF hvor vi kan lede vandet til et par grønne områder/lavn timer i jeres område. Vi har fundet nogle arealer hvor det ikke skulle genere for meget.

Derfor vil I muligvis kunne se at der ligger lidt slanger, men nu kender I årsagen.

### Øvrigt:

Ingen bemærkninger

## Kontaktpersoner

### SK Forsyning

Navn	Telefon	E-mail	Arbejdsområde
Anders Florup Nielsen	5836 2568	<a href="mailto:afn@skforsyning.dk">afn@skforsyning.dk</a>	Projektledelse
Anne Line Hansen	5836 2646	<a href="mailto:alh@skforsyning.dk">alh@skforsyning.dk</a>	Skelbrønde mv.

### Zacho Lind A/S

Navn	Telefon	E-mail	Arbejdsområde
Klaus Møller	2338 4509	<a href="mailto:klm@zacho-lind.dk">klm@zacho-lind.dk</a>	Projektleder

### Slagelse Kommune

Navn	Telefon	E-mail	Arbejdsområde
Miljø ,Plan og Teknik	58573376	<a href="mailto:teknik@slagelse.dk">teknik@slagelse.dk</a>	Myndighed - tillæg spildevandsplan

Der henvises i øvrigt til SK Forsynings hovedtelefon tlf. nr. 5836 2500

Med venlig hilsen

Anders Florup Nielsen  
Ingeniør



**SK Forsyning**

Nordvej 6 - 4200 Slagelse  
Postadresse: Nordvej 7 - 4200 Slagelse  
Telefon: +455836 2566  
[www.skforsyning.dk](http://www.skforsyning.dk)

Fra Klubhuset: Andevig 1A, 4220 Korsør  
Formand: Palle Orth,  
Kasserer: Anne Bruun,  
Næstform./Sekretær: Heidi Boddum,  
Bestyrelses medlem Carsten Kraiberg  
Bestyrelses medlem Kim Sørensen

E-mail: [of.frolunde@gmail.com](mailto:of.frolunde@gmail.com)  
Mobil: 20 44 14 57, E-mail: [palle.of.frolunde@gmail.com](mailto:palle.of.frolunde@gmail.com)  
Mobil: 51 94 14 62, E-mail: [annebruun.of.frolunde@gmail.com](mailto:annebruun.of.frolunde@gmail.com)  
Mobil: 22 43 80 37, E-mail: [heidi.of.frolunde@gmail.com](mailto:heidi.of.frolunde@gmail.com)  
Mobil: 23 23 38 47 E-mail: [carsten.of.frolunde@gmail.com](mailto:carsten.of.frolunde@gmail.com)  
Mobil: 26 35 08 49 Email: [kim.of.frolunde@gmail.com](mailto:kim.of.frolunde@gmail.com)
