



Hej Alle

Hermed SK Forsynings nyhedsmail nr. 2 vedr. det kommende kloakeringsprojekt for Frølunde Fed. Som i nok har bemærket er der godt gang i byggerierne rundt omkring i øjeblikket, hvilket naturligt nok også har skabt en del travlhed ved SK Forsyning. Derfor er den lovede august nyhedsmail blevet til en september nyhedsmail i stedet. Vi har i perioden fra det første nyhedsbrev som blev sendt i starten året arbejdet videre med projektet og vil nedenfor fortælle lidt generelt om status og hvad der skal ske i den kommende periode.

Vi har aftalt med omegnens Fritidshave Forening at foreningen bistår os med at få rundsendt denne infoskrivelse til medlemmerne via foreningens egen nyhedsmail således at så mange som muligt får denne infoskrivelse.


Spildevandsplan: (Sl. Kommune)

Slagelse kommune har udarbejdet "forslag til tillæg 7 Kloakering af Frølunde Fed. Forslaget var oprindeligt forventet endeligt godkendt af byrådet d. 22. marts. Økonomiudvalget valgte imidlertid at udsætte den endelige beslutning da de ønskede en række forhold omkring Omegnens Fritidshaveforening nærmere belyst inden endelig godkendelse af tillægget. Forholdene blev belyst, og tillægget kom til fornyet behandling i økonomiudvalg og byrådet, og blev endeligt vedtaget på byrådsmødet d. 21/6-2021. For yderligere information herom henvises til SL. Kommunes hjemmeside hvor dagsorden, referater inkl. bilag mv. kan findes.

Det endelige vedtagne tillæg kan ses på Sl. Kommunes hjemmeside her: <https://spildevandsplan.slagelse.dk/> (klik på kassen hvor der står spildevandstillæg)



Status for projekt

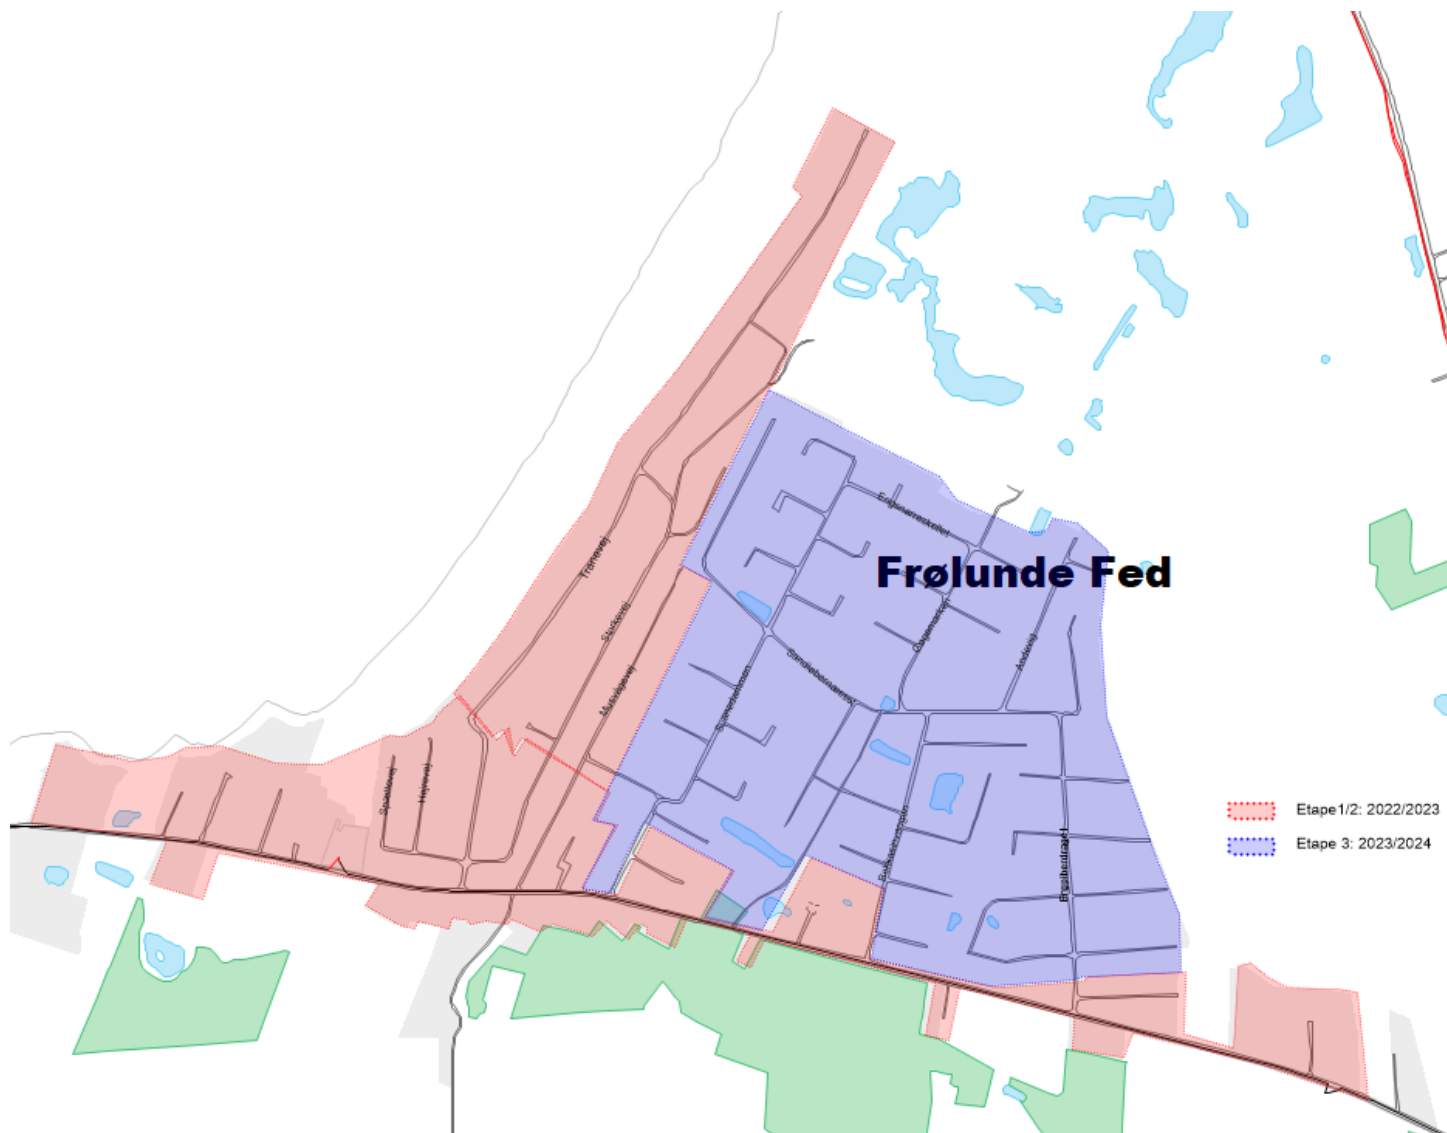

Status - Etape 1/2 (de private matrikler)

Vi er blevet lidt forsinket i forhold til selve udbuddet, men regner stadig med at vi har fået valgt entreprenører lige i starten af det nye år således at gravearbejdet kan starte i foråret 2022. De tidligere etaper 1 & 2 (de private matrikler) er nu samlet til en etape som vi nu udfører i en ombæring. Vi regner stadig med at være færdige med denne del i løbet af foråret 2023.

De opgravninger vi tidligere har lavet på Broholmvej mangler stadig det sidste lag asfalt (slidlag) som lægges ovenpå de eksisterende udførte asfalter. Vi har lavet aftale med kommunen således at slidlaget bliver udført inden tour d. France 2022. Dvs. enten her i løbet af sensommeren/efteråret, eller i løbet af foråret 2022.

Klubhuset: Andevig 1A, 4220 Korsør
Formand: Palle Orth,
Kasserer: Anne Bruun,
Næstform./Sekretær: Heidi Boddum,
Bestyrelses medlem Carsten Kriaberg
Bestyrelses medlem Kim Sørensen

E-mail: of.frolunde@gmail.com
Mobil: 20 44 14 57, E-mail: palle.of.frolunde@gmail.com
Mobil: 51 94 14 62, E-mail: annebruun.of.frolunde@gmail.com
Mobil: 22 43 80 38, E-mail: heidi.of.frolunde@gmail.com
Mobil:, 60 24 62 00 E-mail: carsten.of.frolunde@gmail.com
Mobil:, Kim Sørensen Email: kim.of.frolunde@gmail.com



Vi er så langt med projektet at vi har udsendt skitser med forslag til placering af skelbrønde til en stor del af ejendommene. Dem vi mangler, vil blive udsendt i løbet af den kommende periode. Vi har allerede modtaget mange tilbagemeldinger på skelbrøndsplaceringerne og er i gang med at kigge på disse. Ønsker om skelbrøndsplacering vil vi i øvrigt helst have pr. e-mail (kan sendes til Anne Line Hansen – alh@skforsyning.dk)hvis dette kan lade sig gøre. Vi vil tilstræbe at alle der har fremsendt ønske om skelbrøndsplacering får en tilbagemelding fra os, men hav lidt tålmodighed. Da vi som sagt har fået rigtig mange henvendelser, kan der godt gå noget tid før vi vender tilbage, men vi regner vi at alle vil få en tilbagemelding her i løbet af efteråret.

Ved nogle enkelte ejendomme, vil det blive nødvendigt at etablere hustandspumpestationer inde på selve ejendommen (Hovedsageligt langs Broholmvej). Ligeledes har vi nogle ganske få steder hvor det blive nødvendigt at anlægge enkelte af forsyningens hovedledninger indenfor privat matrikel. Alle de steder hvor dette bliver aktuelt vil vi tage direkte kontakt til ejendommen og komme ud og besøge jer og gennemgår dette grundigt med jer.

Status - Etape 3 (Omegnens Fritidshaveforening)

Med byrådets endelige godkendelse af tillægget til spildevandsplanen har politikerne i byrådet besluttet at jeres område skal kloakeres. Som det ser ud pt., vil anlægsarbejdet for denne del tidligst blive startet op efter sommerferien 2023. Såfremt arbejdet i det første område bliver forsinket, vil det få indflydelse på opstartstidspunktet for etape 3. Vi vil selvfølgelig opdatere løbende om dette i takt med at projektet skrider frem.

På baggrund af ovenstående vil forsyningen nu invitere repræsentanter fra bestyrelsen i OF til en snak om projektet generelt, det videre forløb. Når vi har de generelle forhold på plads, vil vi og jeres foreningsbestyrelse bedre kunne orientere om hvad kloakeringsprojektet kommer til at betyde for den enkelte ejendom.



Øvrigt:

Vi forventer at udsende den næste mail i løbet november/december måned.

Kontaktpersoner

SK Forsyning

Navn	Telefon	E-mail	Arbejdsområde
Anders Florup Nielsen	5836 2568	afn@skforsyning.dk	Projektledelse
Kim Larsen	5836 2566	kil@skforsyning.dk	Projektering
Anne Line Hansen	5836 2646	alh@skforsyning.dk	Fotoreg, skelbrønde mv.

Slagelse Kommune

Navn	Telefon	E-mail	Arbejdsområde
Tine Fehrmann	5857 4786	tifeh@slagelse.dk	Myndighed - tillæg spildevandsplan

Der henvises i øvrigt til SK Forsynings hovedtelefon tlf. nr. 5836 2500

Med venlig hilsen

Anders Florup Nielsen
Ingeniør
