




Hej Alle

Hermed SK Forsynings nyhedsmail nr. 7 vedr. kloakeringsprojektet for Frølunde Fed. Vi har nu fået fastsat en dato for et infomøde hvor der vil blive lejlighed til at få information om projektet samt mulighed for at møde repræsentanter fra både forsyningen og vores entreprenører. Vi har forsøgt at finde en dato som støder op til en weekend, så I må allerede gerne nu sætte et kryds i kalenderen den **16. maj kl. 18. v. SK Forsyning, Nordvej 6, 4200 Slagelse. Bemærk at infomødet kun er for ejendomme i Etape 1/2 (det røde markerede område)**. Da vi ikke har e-mailadresse på alle, vil vi også sørge for at invitationen bliver udsendt pr. brev, men jer der modtager nyhedsmails må selvfølgelig gerne sprede ordet.

Vi har aftalt med omegnens Fritidshave Forening, at foreningen ligeledes bistår os med at få rundsendt denne infoskrivelse til medlemmerne via foreningens egen nyhedsmail således at så mange som muligt får denne infoskrivelse.

Status for projekt

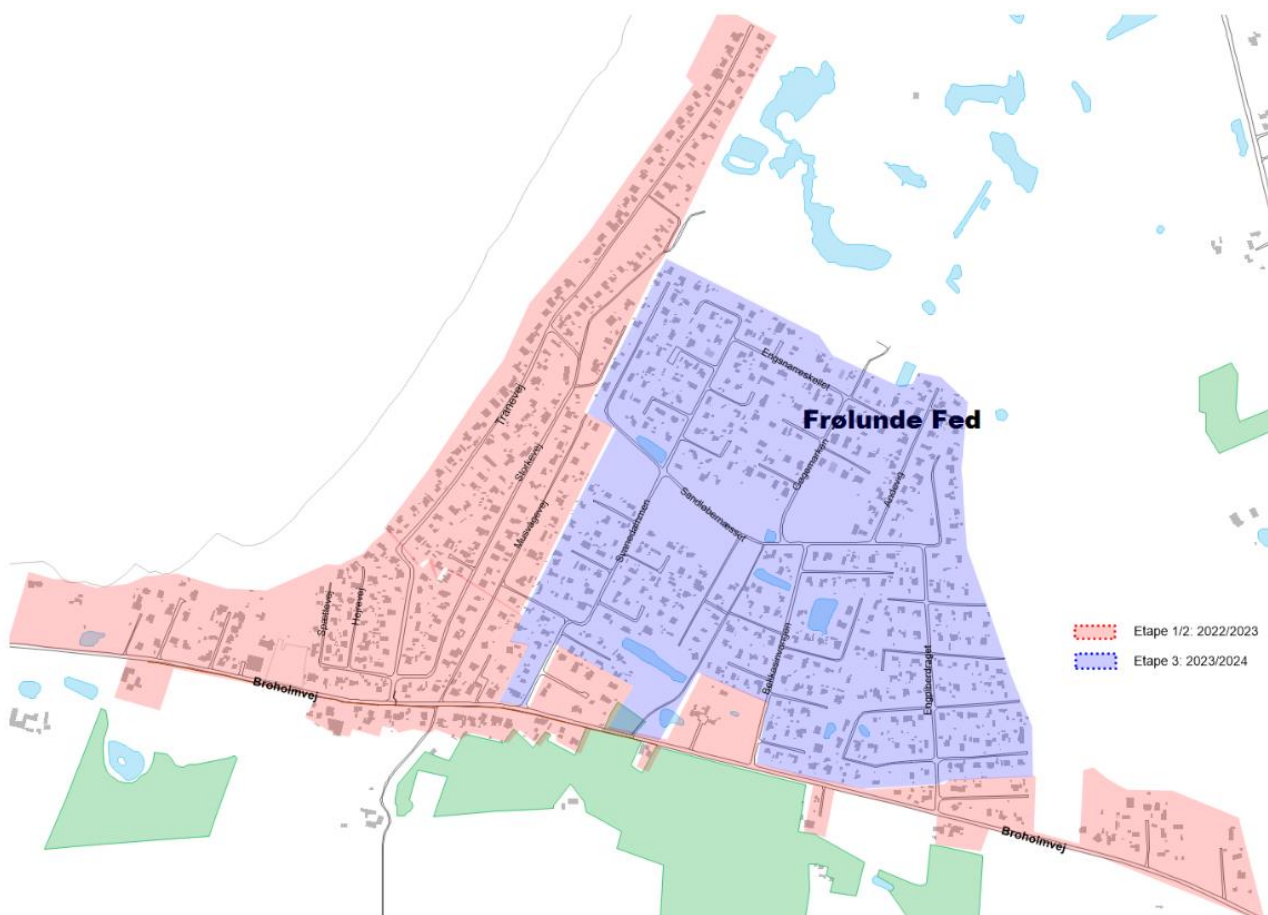

Status - Etape 1/2 (de private matrikler)

Som tidligere beskrevet bliver arbejdet generelt fortsat udført i følgende rækkefølge som nedenfor.

1. Udførelse af styret underboring, inkl. forudgående prøvegravninger for lokalisering af ledninger/kabler
2. Nedboring af hustandspumper og minipumper – inden nedboring etableres lille sugespidsanlæg i området hvor pumpestationen skal nedbores. Sugespidsanlægget fjernes/flyttes igen når pumpebrønd er nedboret.
3. Gravning af hoved og stikledninger – inden opgravning etableres sugespidsanlæg langs udgravningen
4. Gravning for strømforsyning og sætning af styreskabe og kabelskabe (denne aktivitet rykkes muligvis op i rækkefølgen, alt efter hvornår vi kan få leveret styreskabe, og hvornår vi kan få etableret strømforsyning)

Vi fortsætter de kommende uger med at lave styrede boringer på de små stikveje langs Broholmvej, inkl. Musvågevej. Vi arbejder os stadig stille og roligt ud mod Bildsøvej, og som det ser ud pt. vil dette løbe over de næste par uger. **I forbindelse med der arbejdes på Musvågevej vil der blive åbnet op, således der er omkørselsmulighed via Svanedammen/Stenvendertoften.** Jordbundsforholdene (sten i jorden) på Vagtelvej har i den grad drillet os, så vi har været nødt til at få en større boremaskine som i dag gør et nyt forsøg på at bore trykledningen. Vi fortsætter ligeledes med at lave pejleboringer der hvor vi senere skal etablere minipumper.



Uge 18 – styret underboring mv.

Vores entreprenør Zacho Lind forventer arbejde på de ovenfor viste veje. Der vil i forbindelse med boringen blive foretaget enkelte mindre opgravninger, men selve boringen er en såkaldt opgravningsfri metode hvor man som navnet antyder borer ledningen i stedet for at grave den.

Boregrejet fylder en del i landskabet og består typisk af en decideret boremaskine samt en tilhørende lastbil med udstyr. Dvs. mens boringen pågår på den enkelte vej vil det formentlig ikke være muligt at passere med bil. Til gengæld er metoden forholdsvis hurtig (forudsat det ikke driller 😊) så boringen vil typisk tage en halv til en hel dag pr. sted, alt efter hvor langt der skal bores.

I uge 19 forventer vi at fortsætte langs Broholmvej med den styrede boring på de mindre stikveje alt efter hvordan den første uges arbejde er forløbet.

I takt med at arbejdet skrider frem langs Broholmvej vil vi løbende tage kontakt til de berørte ejendomme, her tænkes specielt på de ejendomme hvor vi skal ind og etablere hustandspumper.

Status - Etape 3 (Omegnens Fritidshaveforening)

Som I kan se af ovenstående, vil der i denne uge et par dage være omkørsel for beboerne v Musvågevej. I den forbindelse flytter vi midlertidigt 3 betonkummer ved Stenvendertoften. De sættes på plads igen når vi er færdige.

Næste møde mellem OF og SK er aftalt til d. 31. maj, denne gang i OF 's foreningshus.

Øvrigt:

Ingen bemærkninger

Kontaktpersoner

SK Forsyning

Navn	Telefon	E-mail	Arbejdsområde
Anders Florup Nielsen	5836 2568	afn@skforsyning.dk	Projektledelse
Anne Line Hansen	5836 2646	alh@skforsyning.dk	Skelbrønde mv.

Zacho Lind A/S

Navn	Telefon	E-mail	Arbejdsområde
Klaus Møller	2338 4509	klm@zacho-lind.dk	Projektleder

Slagelse Kommune

Navn	Telefon	E-mail	Arbejdsområde
Miljø ,Plan og Teknik	58573376	teknik@slagelse.dk	Myndighed - tillæg spildevandsplan

Der henvises i øvrigt til SK Forsynings hovedtelefon tlf. nr. 5836 2500

Med venlig hilsen

Anders Florup Nielsen
Ingeniør



SK Forsyning

Nordvej 6 - 4200 Slagelse
Postadresse: Nordvej 7 - 4200 Slagelse
Telefon: +455836 2566
www.skforsyning.dk

Fra Klubhuset: Andevig 1A, 4220 Korsør
Formand: Palle Orth,
Kasserer: Anne Bruun,
Næstform./Sekretær: Heidi Boddum,
Bestyrelses medlem Carsten Kraiberg
Bestyrelses medlem Kim Sørensen

E-mail: of.frolunde@gmail.com
Mobil: 20 44 14 57, E-mail: palle.of.frolunde@gmail.com
Mobil: 51 94 14 62, E-mail: annebruun.of.frolunde@gmail.com
Mobil: 22 43 80 37, E-mail: heidi.of.frolunde@gmail.com
Mobil: 23 23 38 47 E-mail: carsten.of.frolunde@gmail.com
Mobil: 26 35 08 49 Email: kim.of.frolunde@gmail.com
