




Nyhedsbrev nr. 17 fra Envafors (tidligere SK Forsyning)

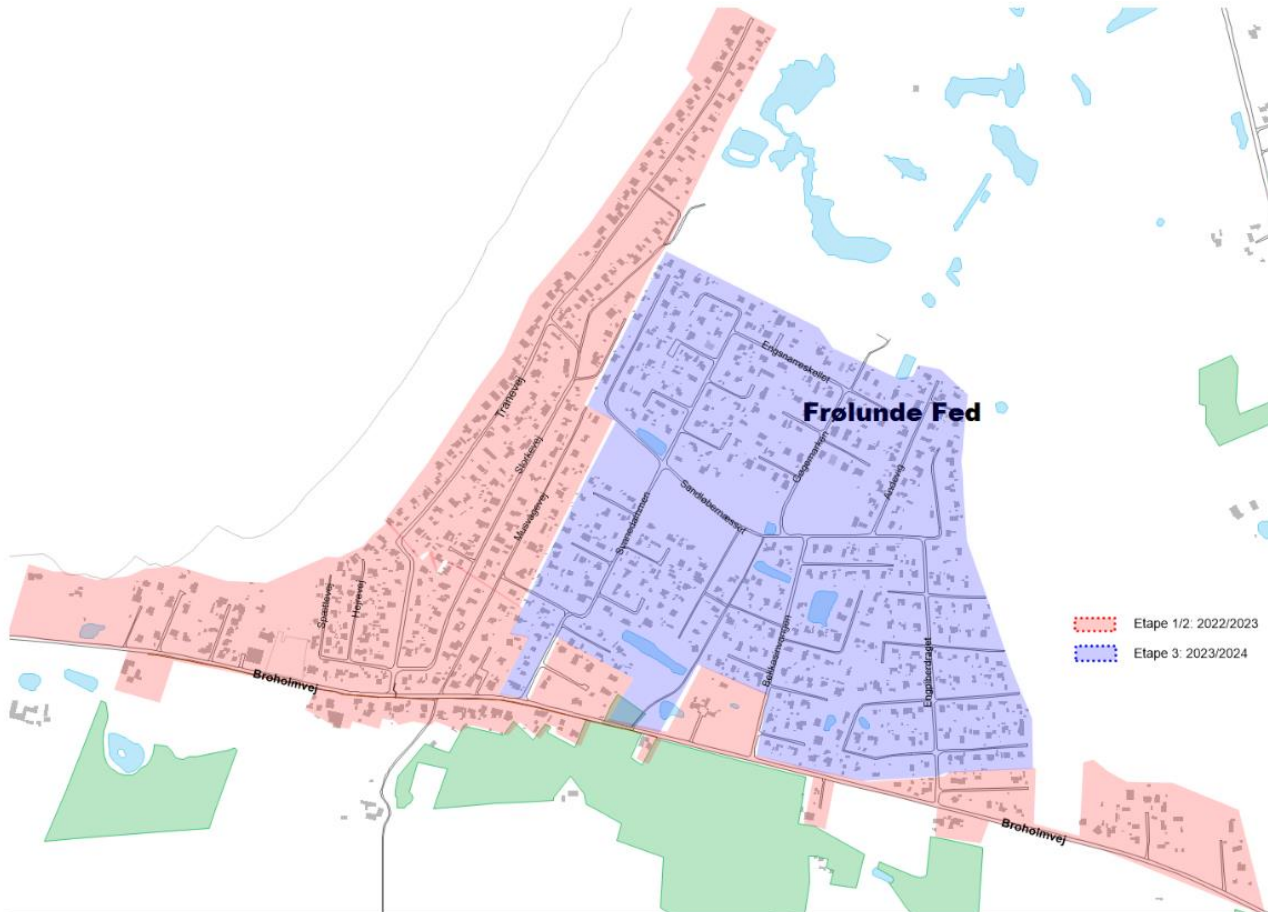

Hermed nyhedsmail nr. 17.

Vi er nu kommet ind i august måned, og jeg er retur fra sommerferie.

Juli måned har været meget våd, hvilket vejene i den grad har båret præg af. Vi beklager de gener, det måtte have givet, og ser frem til, at retableringen snart er færdig.

Status fra projekt

De sidste gravearbejder er afsluttet ved Broholmvej 61 og 87 samt Tranevej 75-81.

Entreprenøren har brugt den seneste måned på at få udbedret alle fejl, som er fundet, da der blev lavet trykprøvning (også kaldet en tæthedsprøvning) på trykledningerne i Broholmvej. Der mangler fortsat én trykprøvning, som laves i Broholmvej i næste uge.

Derudover har entreprenøren rettet styre- og målerskabe.

Entreprenøren er i gang med de sidste retableringsarbejder af både veje og rabatter samt inde på de enkelte ejendomme, og forventer at være i mål med det ultimo uge 33.


I vil derfor modtage en retableringsskrivelse pr. mail i løbet af næste uge, hvor I kan melde tilbage til undertegnede, hvis I synes, det udførte retableringsarbejde er mangelfuldt, eller hvis der er beplantning ved og omkring skelbrønden, som er gået ud. Når fristen for tilbagemeldinger er gået, gennemgår jeg jeres svar. I forhold til plantearbejde laver jeg en liste, så vi kan plante noget nyt til efteråret, hvor beplantningen har de bedste vilkår.

Pumpeleverandørens elektriker er fortsat i fuld gang. Montering og installering i alle styreskabe samt pumpebrøndene forløber over 2 etaper. 1. etape er nu overstået og de er i fuld gang med 2. etape, som forventer at forløbe i august og september.

Enelco har også løbende kontaktet ejendommene med husstandspumper for at installere indendørs. Har Enelco ikke kontaktet jer endnu, bliver I kontaktet i løbet af august måned.

Dato for tilslutningsmulighed:

Inden klarmelding af hele systemet skal vi have lavet en test af systemet, om det virker – det er vi i gang med nu, men det tager tid. I må derfor **ikke** tilslutte jer til det nye spildevandssystem, før I modtager en klarmelding. Denne klarmelding forventer vi, at I får i slutningen af september 2023.

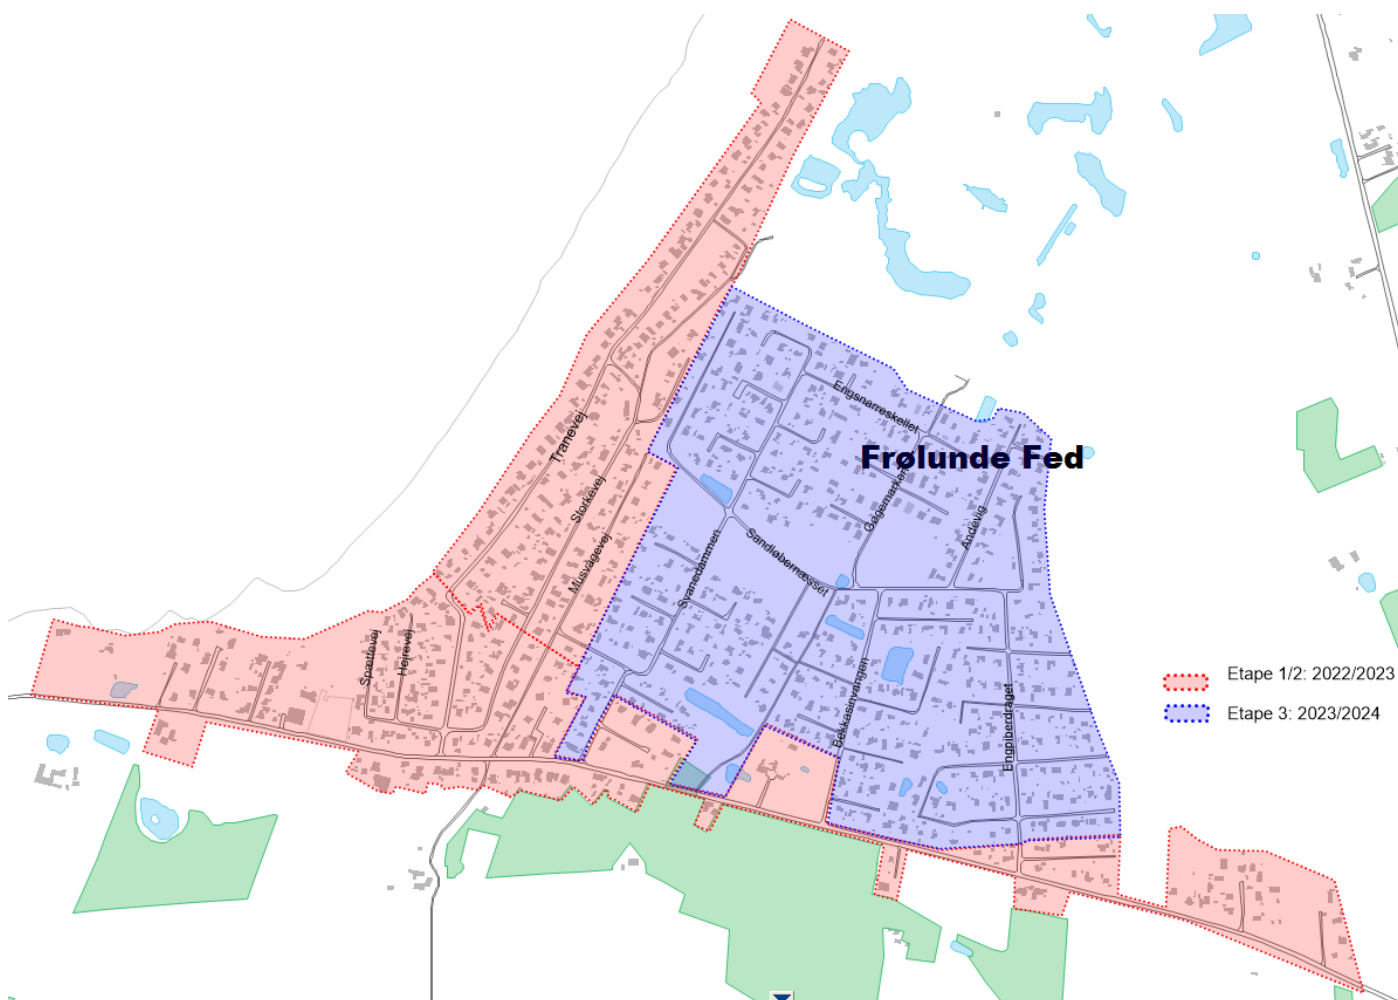

Status - Etape 3 (Omegnens Fritidshaveforening)

Status/Kommende arbejder.

Rådgiverkontrakten blev sendt i EU-udbud i juli måned, og det forventes, at der kan skrives kontrakt under med den vindende rådgiver omkring 1. november 2023. Herefter vil vores rådgiver påbegynde projekteringsarbejdet.

Vi vil snart tage hul på at få lavet en række forundersøgelser, som skal danne grundlag for det senere projekt. Dette vil blandt andet bestå af en geoteknisk forundersøgelse, hvor vi gennem en række geotekniske borer i jeres område får et bedre kendskab til jord- og grundvandsforhold og kan tage højde for dette i vores projekt. Ligeledes vil vi rekvirere en landinspektør el. lign. til at indmåle de eksisterende samletanke/bundfældningstanke/brønde, som ligeledes vil indgå som grundlag i projektet. Entreprenørkontrakten forventes udbudt omkring maj 2024, og forventet opstart af anlægsarbejdet vil være sensommeren 2024. Anlægsarbejdet vil forløbe i 2024-2025. Alt efter hvorledes anlægsarbejdet forløber, vil der formentlig blive tilslutningsmulighed i slutningen af 2025.

Øvrigt:

Kontaktpersoner

DINES JØRGENSEN & CO A/S

Navn	Telefon	E-mail	Arbejdsområde
Pernille Vagner Andersen	5786 0666	pva@dj-co.dk	Projektledelse, tilsyn, borgerkontakt mv

Envafors (tidligere SK Forsyning)

Navn	Telefon	E-mail	Arbejdsområde
Thomas Dahl Strandberg	5836 2548	thostr@envafors.dk	Byggherre

Zacho Lind A/S – (graventreprenør)

Navn	Telefon	E-mail	Arbejdsområde
Zacho Lind A/S, (hovedkontor)	4355 0790	zl@zacho-lind.dk	Udfører gravearbejdet

Slagelse Kommune

Navn	Telefon	E-mail	Arbejdsområde
Miljø ,Plan og Teknik	5857 3376	teknik@slagelse.dk	Myndighed - tillæg spildevandsplan

Der henvises i øvrigt til Envafors hovedtelefon tlf. nr. 5836 2500

I må meget gerne dele info med jeres naboer, da det desværre ikke er alle vi har mailadresser på.

PS: Vi forventer Anders Florup retur igen primo september. De af jer der har ejendomme, hvor vi har placeret ledninger eller pumpebrønde, og hvor anlægget skal tinglyses/deklareres: Anders kigger på det når han er retur.

I ønskes alle en rigtig god dag.

Venlig hilsen

Pernille Vagner Andersen
Anlægsingeniør

DINES JØRGENSEN & CO A/S
Energivej 3
4180 Sorø

Telefon 57 86 06 66
Mobil 23 62 04 98



CVR-nr. 18 41 18 30
Mail pva@dj-co.dk
Web www.dj-co.dk
