




Hej Alle

Hermed SK Forsynings nyhedsmail nr. 11 vedr. kloakeringsprojektet for Frølunde Fed. Vi er nu i fuld gang igen, efter en veloverstået sommerferie. Vi nåede lige inden ferien at rykke til vores nye byggeplads længere nede af Broholmvej. Vi synes selv vi har fået en rigtig fin plads, med meget bedre plads til materiellet, eneste ulempe er at den ligger et stykke fra vores arbejdsområde hvilket betyder at vi kommer til at køre lidt mere frem og tilbage på Broholmvej,

Selv om priserne stiger for tiden (det gør de i den grad også inden for anlægsbranchen), er der stadig godt gang i hjulene rundt omkring, hvilket også rammer vores entreprenører på den måde at det er svært at skaffe folk til deres arbejdsjak. Vi kommer fremad, men ikke helt i det tempo som vi gerne ville.

Status for projekt

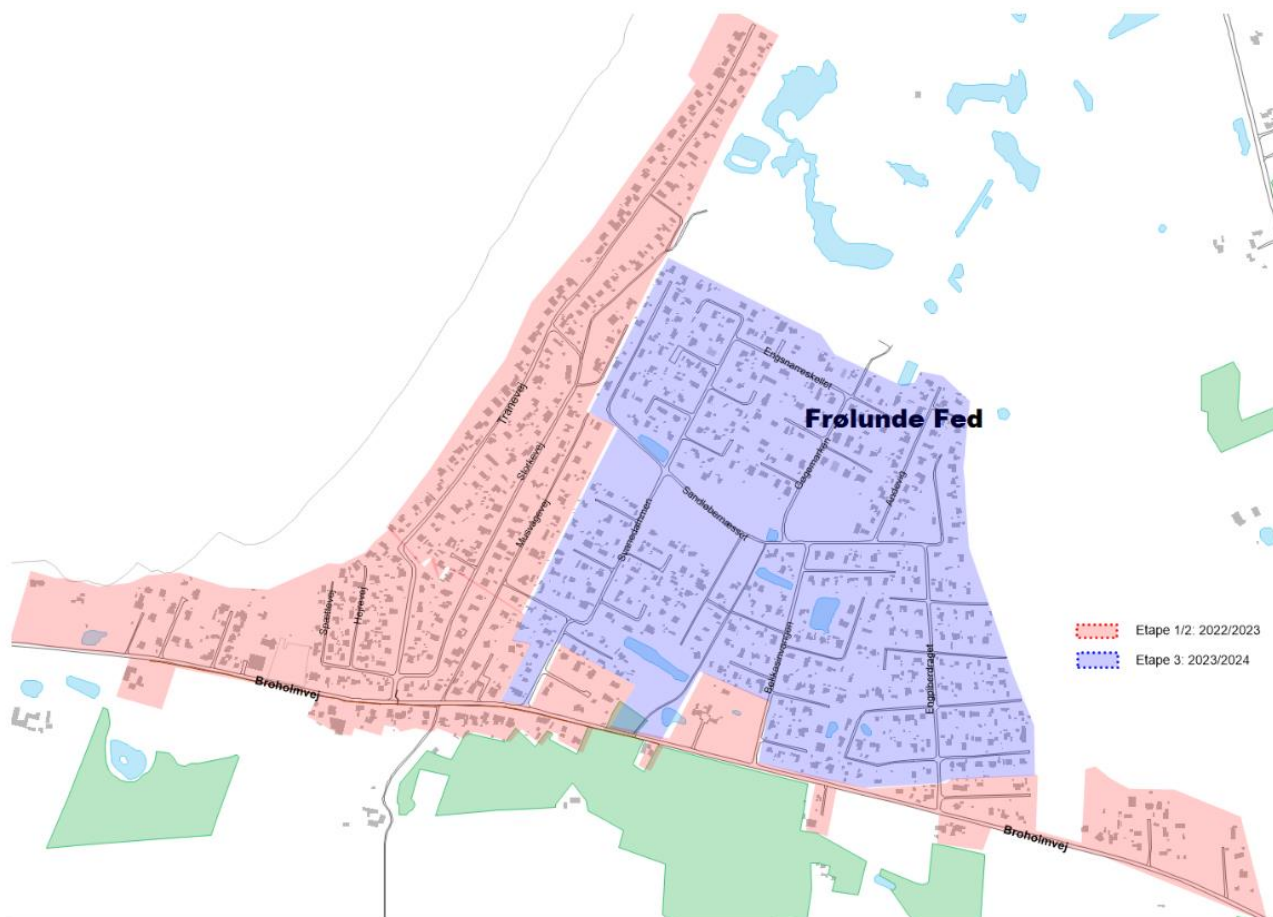

Status - Etape 1/2 (de private matrikler)

Som tidligere beskrevet bliver arbejdet generelt fortsat udført i følgende rækkefølge som nedenfor.

- 1) Udførsel af styret underboring, inkl. forudgående prøvegravninger for lokalisering af ledninger/kabler
- 2) Nedboring af hustandspumper og minipumper – inden nedboring etableres lille sugespidsanlæg i området hvor pumpestationen skal nedbores. Sugespidsanlægget fjernes/flyttes igen når pumpebrønd er nedboret.
- 3) Gravning af hoved og stikledninger – inden opgravning etableres sugespidsanlæg langs udgravningen
- 4) Gravning for strømforsyning og sætning af styreskabe og kabelskabe (denne aktivitet rykkes muligvis op i rækkefølgen, alt efter hvornår vi kan få leveret styreskabe, og hvornår vi kan få etableret strømforsyning)

Vi starter nu på fase 1 med styret underboring på Storkevej, Tranevej, Spættevej og Hejrevej. Vi vil inden den styrede underboring lave en række prøvegravninger for at tjekke at ledninger/kabler nu også ligger der hvor vi nogenlunde forventer. Den styrede underboring fylder en del når vi holder med maskinerne, men til gengæld tager det typisk ½ til en hel dag pr. sted hvis det altså ikke driller. Vi vil søge at tilrettelægge arbejdet således at I har omkørselsmuligheder (Storkevej/Tranevej). På de blinde dele af vejene kan det selvfølgelig ikke undgås at vi spærrer noget, men igen det skulle ikke tage alt for lang tid, og vores entreprenør vil prøve at sikre at der ikke er nogen der bliver spærret inde med bilen.

Til jeres info så har vi inden ovenstående arbejde blev igangsat haft en gennemgang af jeres veje med grundejerforeningen og kommunen, således at vi kender tilstanden af vejene inden vi går i gang. Vi holder i øvrigt også et afsluttende vejsyn når alle vores arbejder (inkl retablering) er udført.

De veje/områder entreprenøren arbejdede på før sommerferien fortsætter vi med her efter sommerferien. Vi vil gerne gøre disse veje så færdige at alle ledninger/brønde/skelbrønde bliver etableret. Herefter vil kun gravning for el+ styreskabe mangle. Vi arbejder i den næste uge fortrinsvis på Vagtelvej og Broholmvej 71-73A og Broholmvej 135-135D (den lille stikvej) og Svanedammen. Vi nedborer muligvis også den første minipumpe på Musvågevej, (kun et stk.) hvis entreprenøren har tid/mandskab til dette.

Vores entreprenør påregner ikke at etablere yderligere sugespidsanlæg i den kommende uge, da dem vi allerede har dækker vores kommende arbejder rimeligt godt.

Status - Etape 3 (Omegnens Fritidshaveforening)

Ikke nogen mødeaktivitet siden sidst. Vi forventer at holde et nyt møde i løbet af efteråret.

Vedr. d. aktuelle kloakering af etape 1/2

I forbindelse med vores sugespidsanlæg, har vi behov for et sted at lede vandet fra anlæggene til. Da der ikke er noget vejafvanding el lign. i området har vi efter aftale med jeres bestyrelse fundet et par steder v. OF hvor vi kan lede vandet til et par grønne områder/lavninger i jeres område. Vi har fundet nogle arealer hvor det ikke skulle genere for meget.

Derfor vil I muligvis kunne se at der ligger lidt slanger, men nu kender I årsagen.

Øvrigt:

Ingen bemærkninger

Kontaktpersoner SK Forsyning

Navn	Telefon	E-mail	Arbejdsområde
Anders Florup Nielsen	5836 2566	afn@skforsyning.dk	Projektledelse
Anne Line Hansen	5836 2646	alh@skforsyning.dk	Skelbrønde mv.

Zacho Lind A/S

Navn	Telefon	E-mail	Arbejdsområde
Klaus Møller	2338 4509	klm@zacho-lind.dk	Projektleder

Slagelse Kommune

Navn	Telefon	E-mail	Arbejdsområde
Miljø ,Plan og Teknik	58573376	teknik@slagelse.dk	Myndighed - tillæg spildevandsplan

Der henvises i øvrigt til SK Forsynings hovedtelefon tlf. nr. 5836 2500

Med venlig hilsen

Anders Florup Nielsen
Ingeniør



SK Forsyning

Nordvej 6 - 4200 Slagelse
Postadresse: Nordvej 7 - 4200 Slagelse
Telefon: +455836 2566
www.skforsyning.dk



Fra Klubhuset: Andevig 1A, 4220 Korsør
Formand: Palle Orth,
Kasserer: Anne Bruun,
Næstform./Sekretær: Heidi Boddum,
Bestyrelses medlem Carsten Kraiberg
Bestyrelses medlem Kim Sørensen

E-mail: of.frolunde@gmail.com
Mobil: 20 44 14 57, E-mail: palle.of.frolunde@gmail.com
Mobil: 51 94 14 62, E-mail: annebruun.of.frolunde@gmail.com
Mobil: 22 43 80 37, E-mail: heidi.of.frolunde@gmail.com
Mobil: 23 23 38 47 E-mail: carsten.of.frolunde@gmail.com
Mobil: 26 35 08 49 Email: kim.of.frolunde@gmail.com
