




Hej Alle

Hermed SK Forsynings nyhedsmail nr. 11 vedr. kloakeringsprojektet for Frølunde Fed. Vi har siden sidste nyhedsmail været i fuld gang med at etablere pumpestationerne, og har ligeledes brugt tid til at alt var klart til Tour d. France. Vi nåede i fin stil at flytte fra vores midlertidige byggeplads til vores nye byggeplads længere nede af Broholmvej. Den nye fine byggeplads bliver entreprenørens "hjem" resten af dette projekt. Sommerferien er over os, så der vil være meget begrænset aktivitet i de kommende uger. I ugerne 27,28,29 og 30 vil der ikke blive foretaget større gravearbejder.

Vi havde i sidste nyhedsbrev lovet at vedhæfte spørgsmål/svar fra vores infomøde tidligere på året. For fuldstændighedens skyld er både præsentationerne, og spørgsmål/svar vedhæftet denne mail.

## Status for projekt

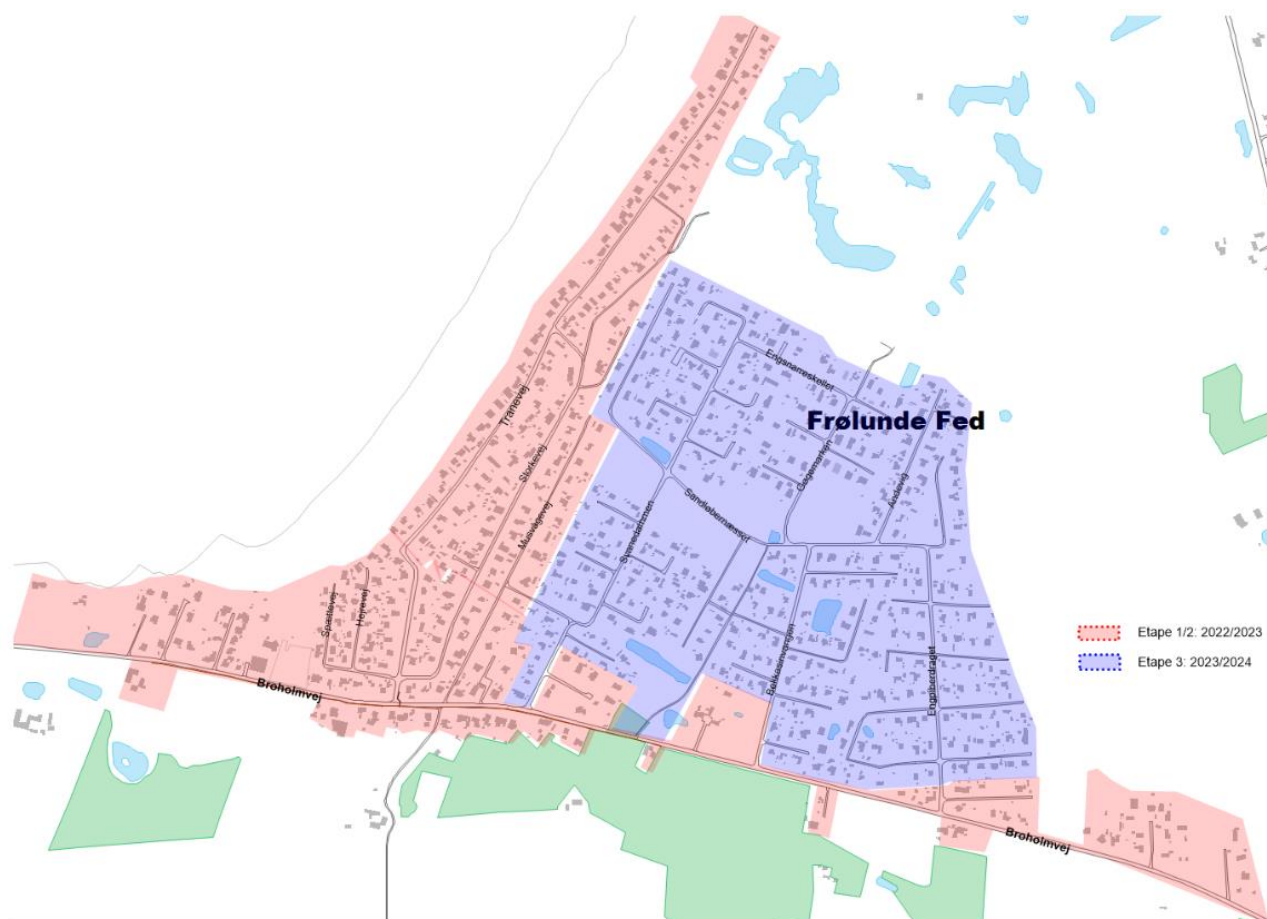

## Status - Etape 1/2 ( de private matrikler)

Som tidligere beskrevet bliver arbejdet generelt fortsat udført i følgende rækkefølge som nedenfor.

- 1) Udførsel af styret underboring, inkl. forudgående prøvegravninger for lokalisering af ledninger/kabler
- 2) Nedboring af hustandspumper og minipumper – inden nedboring etableres lille sugespidsanlæg i området hvor pumpestationen skal nedbores. Sugespidsanlægget fjernes/flyttes igen når pumpebrønd er nedboret.
- 3) Gravning af hoved og stikledninger – inden opgravning etableres sugespidsanlæg langs udgravningen
- 4) Gravning for strømforsyning og sætning af styreskabe og kabelskabe (denne aktivitet rykkes muligvis op i rækkefølgen, alt efter hvornår vi kan få leveret styreskabe, og hvornår vi kan få etableret strømforsyning)

Vi har i perioden siden sidst fortrinsvist fået nedgravet/nedboret yderligere pumpestationer. Det vi kan se, er at nogen steder går det superfint. Andre steder har det været noget op ad bakke at få sat pumpestationerne. Jord og grundvandsforhold skifter utroligt meget så det har taget entreprenøren alt fra 2 timer til 3 dage at sætte en enkelt pumpebrønd, alt efter jordbundsforholdene.

I sommerferieperioden i ugerne 27,28, og 29 slukker vi for sugespidsanlæggene, således at I får lidt fred for disse her i sommerferien. Vi starter sugespidsanlæggene igen i uge 30 for at være klar igen til gravearbejderne som starter op fra uge 31.

Efter sommerferien vil fase2: (Nedboring/gravning af Hustandspumper og minipumper) blive påbegyndt på følgende lokationer: Broholmvej 75,87,170,133, 135E, 152, Vagtelvej, Svanedammen, Musvågevej ( sugespidsanlæg startes før gravearbejdet går i gang)

Efter sommerferien vil fase 3: (gravning for hoved og stikledninger) blive påbegyndt på følgende veje Broholmvej 71A-73C uge31/32, Vagtelvej uge32/33, Broholmvej 69-69C uge 33/34. Ugenumrene er vejledende. ( sugespidsanlæg skal startes før gravearbejdet) Gravearbejdet vil fortrinsvis foregå i selve vejen, så adgangsforholdene specielt for indkørsel af biler kan godt blive lidt udfordrerne i graveperioden.

Tranevej ,Spættevej, Hejrevej Storkevej: Der vil ikke blive arbejdet på jeres veje før efter sommerferien. I uge 31 vil der blive foretaget afsætning/opmåling, og fra uge 32 vil der blive foretaget prøvegravninger og styret underboring, under forudsætning af at entreprenøren kan få leveret trykledningerne. Der er aftalt vejssyn d. 3. aug med deltagelse af jeres grundejerforening, og kommunen, således at tilstanden af vejene er gennemgået inden anlægsarbejdet startes op. Yderligere info om de styrede underboringer efter sommerferien når vi kender tidspunkt for levering af trykledninger.

## Status - Etape 3 (Omegnens Fritidshaveforening)

### Vedr. d. aktuelle kloakering af etape 1/2

I forbindelse med vores sugespidsanlæg, har vi behov for et sted at lede vandet fra anlæggene til. Da der ikke er noget vejafvanding el lign. i området har vi efter aftale med jeres bestyrelse fundet et par steder v. OF hvor vi kan lede vandet til et par grønne områder/lavn timer i jeres område. Vi har fundet nogle arealer hvor det ikke skulle genere for meget.

Derfor vil I muligvis kunne se at der ligger lidt slanger, men nu kender I årsagen. Som I kan se af ovenstående har vi valgt at stoppe sugespidsanlæggene i sommerferieperioden, men de vil blive sat i drift igen efter sommerferien.

### Øvrigt:

Ingen bemærkninger

## Kontaktoplysninger i sommerferieperioden: uge 28,29,30

Envafors (SK Forsyning) 58 36 25 00 – kontaktperson Johnny Nielsen

Zacho Lind: tlf. 43 55 07 90

Med venlig hilsen

Anders Florup Nielsen  
Ingeniør



**SK Forsyning**

Nordvej 6 - 4200 Slagelse  
Postadresse: Nordvej 7 - 4200 Slagelse  
Telefon: +455836 2566  
[www.skforsyning.dk](http://www.skforsyning.dk)



Fra Klubhuset: Andevig 1A, 4220 Korsør

Formand: Palle Orth,  
Kasserer: Anne Bruun,  
Næstform./Sekretær: Heidi Boddum,  
Bestyrelses medlem Carsten Kraiberg  
Bestyrelses medlem Kim Sørensen

E-mail: [of.frolunde@gmail.com](mailto:of.frolunde@gmail.com)

Mobil: 20 44 14 57, E-mail: [palle.of.frolunde@gmail.com](mailto:palle.of.frolunde@gmail.com)  
Mobil: 51 94 14 62, E-mail: [annebruun.of.frolunde@gmail.com](mailto:annebruun.of.frolunde@gmail.com)  
Mobil: 22 43 80 37, E-mail: [heidi.of.frolunde@gmail.com](mailto:heidi.of.frolunde@gmail.com)  
Mobil: 23 23 38 47 E-mail: [carsten.of.frolunde@gmail.com](mailto:carsten.of.frolunde@gmail.com)  
Mobil: 26 35 08 49 Email: [kim.of.frolunde@gmail.com](mailto:kim.of.frolunde@gmail.com)
